Procès verbal de la réunion du 26.02.2026 (Duckify)

Présent: Pierre-Yves Savioz, Alexandre Venturi, Jeremy Duc, Cédric Mariéthoz, Marco Caporizzi, Nathan Antonietti, Kevin Voisin, Louis Heredero, M. Lettru, M. Travelletto, M. Misk

Lieu: 23N308 | **Heure**: 8h15 | **Scribe**: Jeremy Duc

Contexte

Cette réunion a été mise en place dans le but que l'équipe travaillant sur le projet Duckify puisse présenter a M.Misk le pipeline de production prévu selon plusieurs alternatives et l'interoger sur certains choix à arrêter.

Dicussions

1. **Proposition de l'équipe**
   - Un modèle de canard unique, sur lequelle la texture désirée par le consommateur serait appliquée
   - **Décision de M.Misk** : L'idée d'un modèle de canard fixe est validée
2. **Proposition de l'équipe**
   - Utiliser un modèle de canard précis, selon visualisation 1 dans **Annexes**
   - **Décision de M.Misk** : Ce modèle ne correspond pas aux attentes. Demande de recevoir une sélection de modèles plus arrondis pour arrêter un choix. Propose à l'équipe d'en chercher sur « BlenderMarketPlace ».
3. **Proposition de l'équipe**
   - Arrêter un choix sur le processus de génération de la texture a appliquée au canard
   - **Commentaire de M.Misk** : Les alternatives présentées ne sont pas suffisament claire et sourcées (en coût) pour qu'une décision soit prise.
4. **Discussion**
   - Le choix de l'interface entre le client et le processus de production a été évoqué.
   - **Commentaire de M.Misk** : L'utilisation d'une interface web, par exemple via le site de l'entreprise est une piste intéressante.
5. **Information de l'équipe**
   - Les contraintes suivantes sont a prendre note :
     - Lors de la phase d'application de la texture sur le canard, le nombre de couleurs sera limité (4 à 6)
     - Le temps de production d'un canard est estimé > 8h (10 min. de génération de texture, 7h d'impression 3d du canard et plusieurs dizaines de minutes d'application de la texture sur le canard)

Planification

La prochaine réunion a été planifiée au mardi 3 mars à 10h30.

Annexes

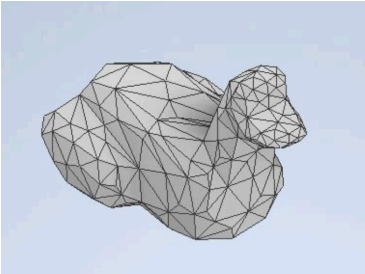

Fig. 1. – Modèle proposé lors de la réunion (rejeté)
